


баня «Абрикосовая»

Площадь бани: **33,7 м²**
Площадь террас и балконов: **30,7 м²**
Габариты бани: **8х8,9 м**
Сечение бруса: **140*140 мм**

СОСТАВ ПОМЕЩЕНИЙ

- комната отдыха
- парная
- помывочная
- раздевалка
- с/у
- терраса

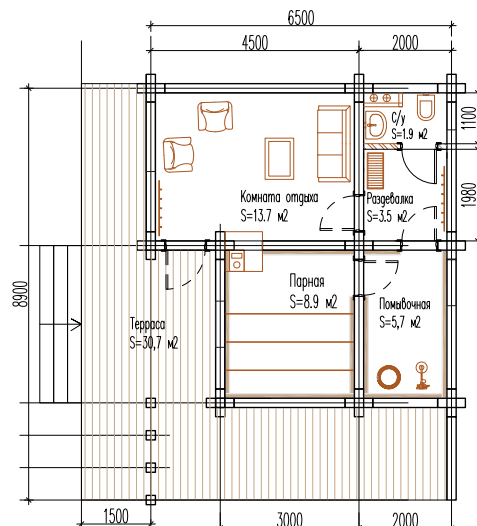

п/п	Наименование	Объем, м ³	Цена без НДС, руб.	Стоимость без НДС, руб.
1 раздел: Внутренние и наружные стены + обработка и защита антисептиком				
1	Брус массив камерной сушки, профилированный с зарезанными чашками (сосна) выс. 140 х шир. 140	21,95	15 250,00	334 737,50
2	Брус массив (лиственница) 200х200х6000	3,6	14 000,00	50 400,00
3	Брус массив камерной сушки, не профилированный (сосна) 140х140х6000	0,7056	13 500,00	9 525,60
2 раздел: Перекрытия				
1	Брус массив (лиственница) 100х200х6000	1,92	14 000,00	26 880,00
2	Брус массив камерной сушки, не профилированный (хвойная порода) 140х190х6000	1,4364	13 300,00	19 104,12
3 раздел: Стропильная система				
1	Доска сухая не строганая (сосна) 50х200х6000	2,4	11 500,00	27 600,00
2	Доска сухая не строганая (сосна) 25х100х6000	0,75	10 500,00	7 875,00
			ИТОГО:	476 122,22
Брус массив ПРЕМИУМ камерной сушки, профилированный с зарезанными чашками (сосна) выс. 140 х шир. 140			ИТОГО:	524 412,22

Мы благодарим Вас за оказанный интерес. Вы уже ознакомились с опытом нашей компании на сайте **rdd24.ru**.

Порядок оплаты деревянного конструктива - предоплата 50% перед началом изготовления домокомплекта на заводе, оплата оставшихся 50% перед отгрузкой домокомплекта.

Представленная спецификация носит предварительный характер и может быть уточнена после разработки и утверждения проекта разбивки.

Стоимость стенового комплекта по данному проекту ориентировочно составит **476 122,22 руб.**

Стоимость стенового комплекта по данному проекту из бруса массива **ПРЕМИУМ** камерной сушки ориентировочно составит **524 412,22 руб.**

* В стоимость включены - изготовление домокомплекта на заводе, обработка торцов антисептиком, упаковка в специализированную пленку, погрузка в еврофуру.

** Стандартный комплект поставки: наружные и внутренние стены, столбы, окладной венец из лиственницы, балки перекрытия, стропильная система, обрешетка.
