


ДОМ «ТОЛСТОЙ»

Площадь дома: **262,8 м²**
Площадь террас и балконов: **60,6 м²**
Габариты дома: **15,4x13,0 м**
Сечение бруса: **140*140 мм**

СОСТАВ ПОМЕЩЕНИЙ

- 4 спальни
- гостиная
- тамбур
- терраса
- постирочная
- кухня-столовая
- 2 с/у
- тех. помещение
- кладовая

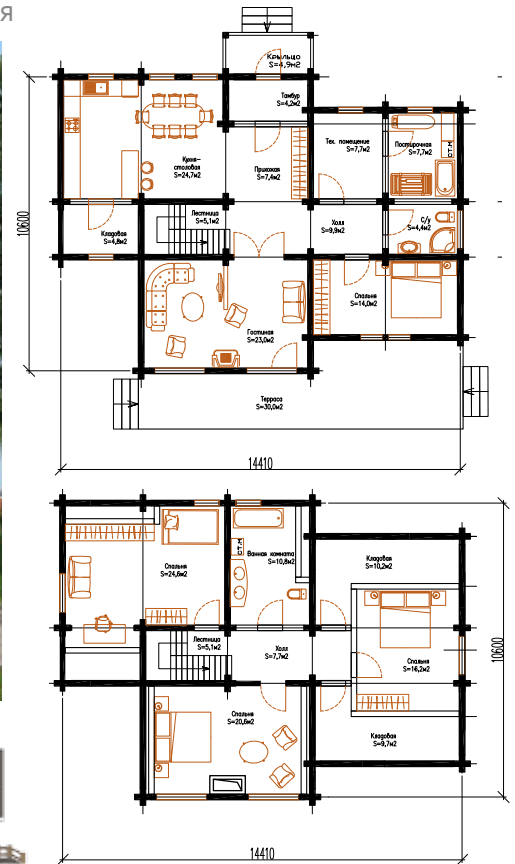

п/п	Наименование	Объем, м ³	Цена без НДС, руб.	Стоимость без НДС, руб.
1 раздел: Внутренние и наружные стены + обработка и защита антисептиком				
1	Брус массив камерной сушки, профилированный с зарезанными чашками (сосна) выс. 140 х шир. 140	68,5263	15 250,00	1 045 026,08
2	Брус массив (лиственница) 200x200x6000	5,28	14 000,00	73 920,00
3	Брус массив камерной сушки, не профилированный (сосна) 140x140x6000	0,2352	13 500,00	3 175,20
2 раздел: Перекрытия				
1	Брус массив (лиственница) 100x200x6000	4,32	14 000,00	60 480,00
2	Брус массив камерной сушки, не профилированный (хвойная порода) 140x190x6000	5,4264	13 300,00	72 171,12
3 раздел: Стропильная система				
1	Доска сухая не строганая (сосна) 50x200x6000	6	11 500,00	69 000,00
2	Доска сухая не строганая (сосна) 25x100x6000	1,95	10 500,00	20 475,00
			ИТОГО:	1 344 247,40
Брус массив ПРЕМИУМ камерной сушки, профилированный с зарезанными чашками (сосна) выс. 140 х шир. 140			ИТОГО:	1 495 005,26

Мы благодарим Вас за оказанный интерес. Вы уже ознакомились с опытом нашей компании на сайте **rdd24.ru**.

Порядок оплаты деревянного конструктива – предоплата 50% перед началом изготовления домокомплекта на заводе, оплата оставшихся 50% перед отгрузкой домокомплекта.

Представленная спецификация носит предварительный характер и может быть уточнена после разработки и утверждения проекта разбивки.

Стоимость стенового комплекта по данному проекту ориентировочно составит **1 344 247,40 руб.**

Стоимость стенового комплекта по данному проекту из бруса массива **ПРЕМИУМ** камерной сушки ориентировочно составит **1 495 005,26 руб.**

* В стоимость включены - изготовление домокомплекта на заводе, обработка торцов антисептиком, упаковка в специализированную пленку, погрузка в еврофуру.

** Стандартный комплект поставки: наружные и внутренние стены, столбы, окладной венец из лиственницы, балки перекрытия, стропильная система, обрешетка.
